



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com Telefax (076) 837000



“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

Resolución de Alcaldía No. 052 - 2018 - MPC

Contumazá, 12 de Febrero del 2018

EL ALCALDE PROVINCIAL DE CONTUMAZA;

VISTO: el Informe N°044-2018-MPC/GM, emitido por la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Contumazá y el Informe N° 087- 2018-MPC-GDUR, del Gerente de Desarrollo Urbano Rural sobre Liquidación Final de la Obra “**CREACIÓN DE LOZA DEPORTIVA SALCOT, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA – CAJAMARCA**” Con código SNIP N° **384839**.

CONSIDERANDO:

Que, según el expediente “**CREACIÓN DE LOZA DEPORTIVA SALCOT, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA – CAJAMARCA**” Con código SNIP N° **384839** que se tiene a la vista y de los documentos alcanzados por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural se manifiesta la Conformidad de la obra indicada.

Que, la mencionada Obra fue ejecutada por la Municipalidad Provincial de Contumazá , bajo la modalidad de Administración Directa.

Que, la liquidación de la “**CREACIÓN DE LOZA DEPORTIVA SALCOT, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA – CAJAMARCA**” Con código SNIP N° **384839**, contiene la siguiente información:

A. DATOS GENERALES

OBRA	: CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN EL CASERÍO SALCOT, DISTRITO DE CONTUMAZÁ, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
UBICACIÓN	: SALCOT - CONTUMAZA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: ADMINISRACIÓN DIRECTA
MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO	: S/. 62,562.45
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	: 45 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 01 DE JUNIO DEL 2017
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 01 DE JUNIO DEL 2017
FECHA DE TÉRMINO DE OBRA	: 15 DE JULIO DEL 2017
FECHA DE TÉRMINO REAL	: 15 DE JULIO DEL 2017
PLAZO REAL EJECUCIÓN DE OBRA	: 45 DIAS CALENDARIOS
ING. RESIDENTE DE OBRA	: ING. LEONARDO TERÁN MENDOZA
ING. INSPECTOR DE OBRA	: ING. LORD POMPEO AZAÑEDO
ALCÁNTARA	
CODIGO SNIP	: 384839
ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com Telefax (076) 837000





"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

B. RESUMEN DE VALORIZACIONES

EJECUTADO						
MES	FECHA	VAL N°	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE ACUMULADO
jun-16	30/06/2017	N° 001	43,261.93	43,261.93	69.15%	69.15%
jul-17	15/07/2017	N° 002	19,300.52	62,562.45	30.85%	100.00%
TOTAL SI.			SI. 62,562.45	62,562.45		

C. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO

GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS REALMENTE EJECUTADO ACUMULADO

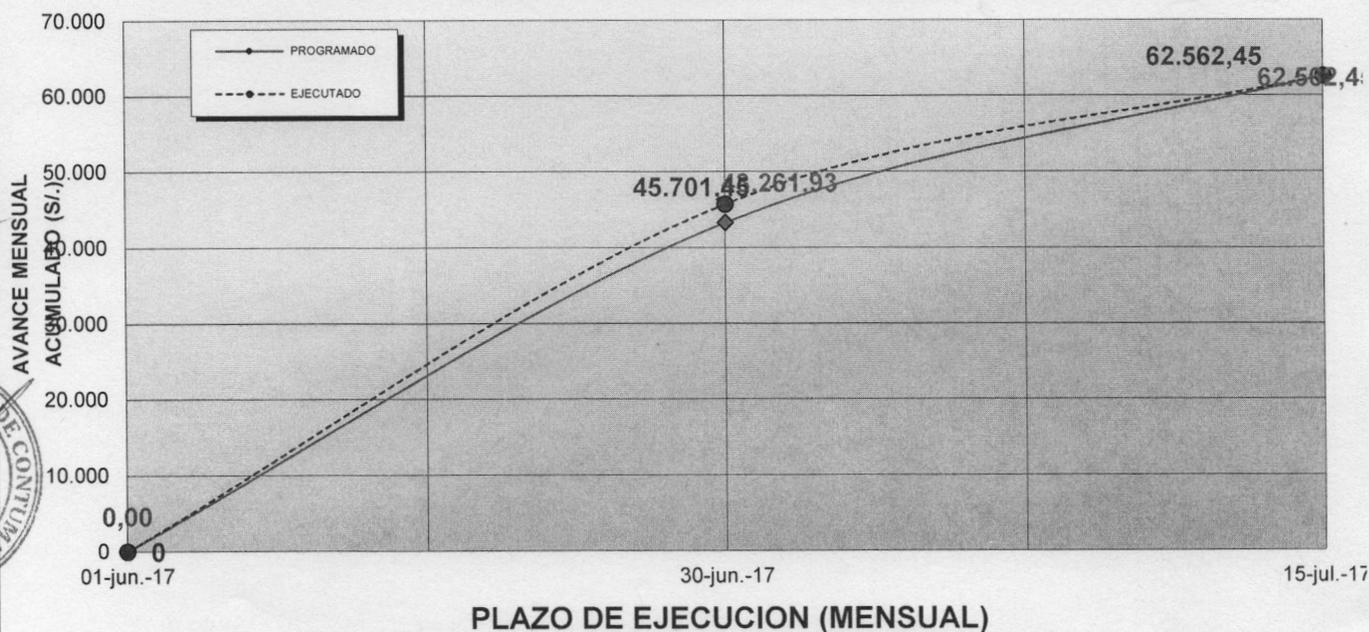



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com Telefax (076) 837000



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

D. RESUMEN DEL GASTO

RESUMEN DEL GASTO		IMPORTE TOTAL S/.
PERSONAL Y OBLIGACIONES	S/.	13,590.00
Gastos en Planilla de Obreros	S/.	13,590.00
BIENES	S/.	26,273.00
Materiales de construcción	S/.	15,928.50
Combustible	S/.	2,994.50
Madera	S/.	940.00
Otros Bienes (equipamiento deportivo, arcos y otros)	S/.	6,410.00
SERVICIOS	S/.	1,600.00
Instalación de malla y pintado cancha	S/.	1,600.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.	S/.	41,463.00

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 SOLES

E. DETALLE DE LA INVERSIÓN

Presupuesto Expediente Técnico	S/.	62,562.45
Inversión Realizada	S/.	41,463.00
Total liquidado Municipalidad Provincial de Contumazá	S/.	41,463.00

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 SOLES

Saldo a favor de las arcas de la Municipalidad Provincial de Contumazá S/. 21,099.45.

I. CONCLUSIONES

- Hago de su conocimiento que durante la recepción de la obra, ejecutada la revisión de los expedientes técnicos y los documentos que sustentan los gastos ejecutados, no se encontraron OBSERVACIONES en la ejecución técnica y financiera, desglosando el siguiente detalle de gastos:

Presupuesto Expediente Técnico	S/.	62,562.45
Inversión Realizada	S/.	41,463.00

- Encontrándose un ahorro para la Municipalidad de S/. 21,099.45 (veintiún mil noventa y nueve con 45/100 soles), en comparación al presupuesto del expediente técnico aprobado.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 20º, inc. 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com Telefax (076) 837000



“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO .- APROBAR, la Liquidación de la “**CREACIÓN DE LOZA DEPORTIVA SALCOT, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA – CAJAMARCA**” Con código SNIP N° **384839** de acuerdo a detalle descrito en la parte considerativa, la misma que asciende a S/. 62,562.45 (SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 45/100 SOLES)

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVASE.



[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
WILDOF RODRIGUEZ DIAZ
ALCALDE

