



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com Telefax (076) 837000



“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

Resolución de Alcaldía No. 051 - 2018 - MPC

Contumazá, 12 de Febrero del 2018

EL ALCALDE PROVINCIAL DE CONTUMAZA;

VISTO: el Informe N°044-2018-MPC/GM, emitido por la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Contumazá y el Informe N° 087- 2018-MPC-GDUR, del Gerente de Desarrollo Urbano Rural sobre Liquidación Final de la Obra “**CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ISCAYACU BAJO, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA – CAJAMARCA**” Con código SNIP N° 374180.

CONSIDERANDO:



Que, según el expediente “**CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ISCAYACU BAJO, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA – CAJAMARCA**” Con código SNIP N° 374180. que se tiene a la vista y de los documentos alcanzados por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural se manifiesta la Conformidad de la obra indicada.

Que, la mencionada Obra fue ejecutada por la Municipalidad Provincial de Contumazá , bajo la modalidad de Administración Directa.

Que, la liquidación de la Obra “**CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ISCAYACU BAJO, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA – CAJAMARCA**” Con código SNIP N° 374180, contiene la siguiente información:

A. DATOS GENERALES

OBRA	: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ISCAYACO BAJO, DISTRITO DE CONTUMAZÁ, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
UBICACIÓN	: ISCAYACO BAJO - CONTUMAZA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO	: S/. 135,527.79
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	: 90 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 12 DE DICIEMBRE DEL 2016
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 12 DE DICIEMBRE DEL 2016
FECHA DE TÉRMINO DE OBRA	: 11 DE MARZO DEL 2017
FECHA DE TÉRMINO REAL	: 19 DE MARZO DEL 2017
PLAZO REAL EJECUCIÓN DE OBRA	: 98 DIAS CALENDARIOS
ING. RESIDENTE DE OBRA	: ING. LEONARDO TERÁN MENDOZA
ING. INSPECTOR DE OBRA	: ING. GOLBERY O. FRANCO RABANAL
CODIGO SNIP	: 374180





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com Telefax (076) 837000




“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ


B. RESUMEN DE VALORIZACIONES

EJECUTADO						
MES	FECHA	VAL N°	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE ACUMULADO
dic-16	31/12/2016	N° 001	S/. 33,390.03	S/. 33,390.03	24.64%	24.64%
ene-17	31/01/2017	N° 002	S/. 33,193.63	S/. 66,583.66	24.49%	49.13%
feb-17	28/02/2017	N° 003	S/. 55,801.48	S/. 122,385.14	41.17%	90.30%
abr-17	11/03/2017	N° 004	S/. 13,142.65	S/. 135,527.79	9.70%	100.00%
TOTAL S/.			S/. 135,527.79	135,527.79		

C. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO

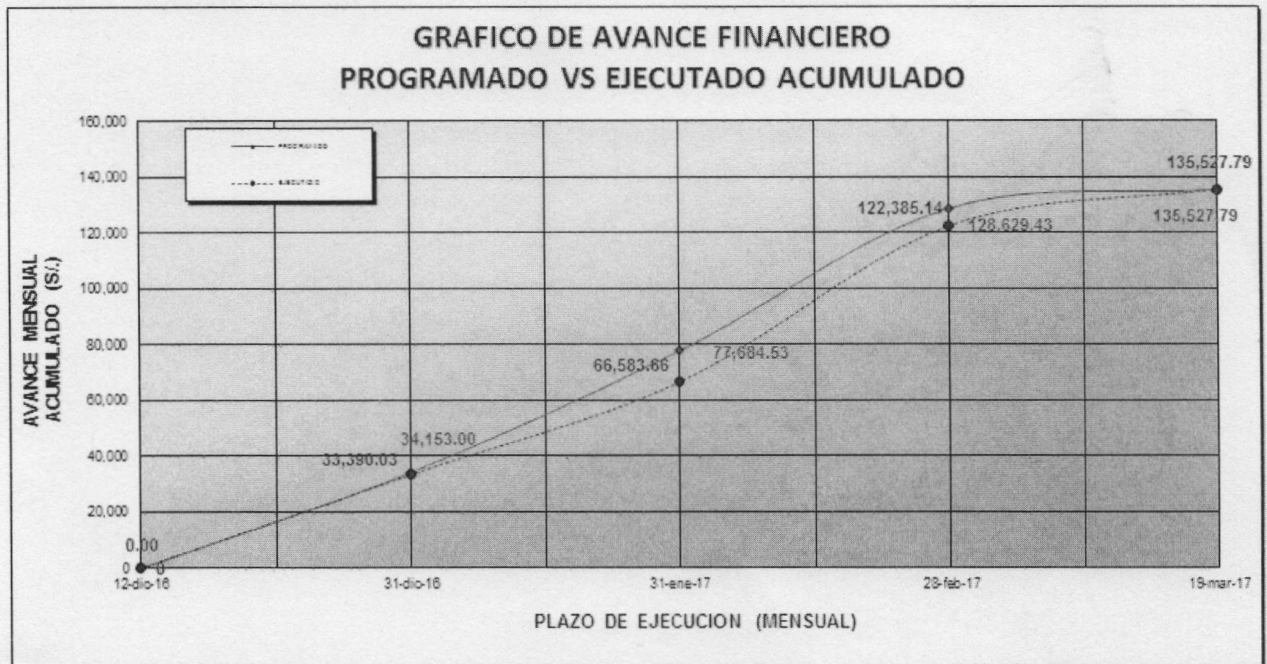

D. RESUMEN DEL GASTO





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Jr. Octavio Alva N° 260 municontumaza@hotmail.com Telefax (076) 837000



“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

RESUMEN DEL GASTO	IMPORTE TOTAL S/.
PERSONAL Y OBLIGACIONES	S/. 62,635.00
Gastos en Planilla de Obreros	S/. 62,635.00
BIENES	S/. 37,104.53
Materiales de construcción	S/. 33,702.93
Combustible	S/. 1,750.00
Madera	S/. 1,651.60
SERVICIOS	S/. 138.24
Residencia	
Elaboración Expediente Técnico	
Otros Servicios	S/. 138.24
TOTAL PRESUPUESTO S/.	S/. 99,877.77
Noventa y nueve mil ochocientos setenta y siete con 77/100 soles.	

E. DETALLE DE LA INVERSIÓN

Presupuesto Expediente Técnico	S/. 135,527.79
Inversión Realizada	S/. 99,877.77
Total liquidado Municipalidad Provincial de Contumazá	S/. 99,877.77

- Encontrándose un ahorro para la Municipalidad de S/. 35,650.02 (treinta y cinco mil seiscientos cincuenta con 02/100 soles), en comparación al presupuesto del expediente técnico aprobado.
- Se tuvo una ampliación de plazo de 08 días calendarios debido a las fuertes lluvias de la temporada.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 20°, inc. 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO .- APROBAR, la Liquidación de la Obra “**CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ISCAYACU BAJO, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA – CAJAMARCA**” Con código SNIP N° **374180**.de acuerdo a detalle descrito en la parte considerativa, la misma que asciende a S/. 99,877.77 (NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 77/100 SOLES)

COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

Ing. WILSON RODRIGUEZ DIAZ
ALCALDE

